Съфинансирано от Европейския съюз

Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г.

Комитет за наблюдение

ОСМО ЗАСЕДАНИЕ



26.10.2026 г.

Дирекция „Международни проекти“- МВР

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД



Съфинансирано от Европейския съюз



ПРЕДСТОЯЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА 2021-2027 г.

Съфинансирано от Европейския съюз



ПРЕДСТОЯЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА-1

- **Включване на две нови специфични действия в рамките на СЦ 1 „Европейско интегрирано управление на границите“**

- Специфично действие “Подкрепа за държавите членки за подобряване на техните биометрични възможности във връзка с Шенгенската информационна система (ШИС)”

  - Покана до държавите членки – м. април 2026 г.
  - Бюджет – 15 000 000 евро, разпределени по равно между държавите членки

- Предложение по поканата – подадено към ЕК на 15 юни 2026 г. на стойност 524 109 евро с включено национално съфинансиране

  - Дейности – доставка на 50 бр. специализирани мобилни устройства за снемане на пръстови отпечатъци и лицеви изображения и сканиране на документи за пътуване и визи за РДГП Драгоман – 16 бр., РДГП Бургас – 2 бр., РДГП Елхово – 22 бр. и РДГП Кюстендил – 10 бр.
  - ✓ Одобрено от ЕК на 16 септември 2026 г.

- Бенефициент – Главна дирекция „Гранична полиция“-МВР

Съфинансирано от Европейския съюз



ПРЕДСТОЯЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА-2

- Специфично действие “Подкрепа за способностите за гранично управление, включително дронове и мерки за борба с дроновете”

- ✓ Покана до държавите членки – м. декември 2025 г.
- ✓ Бюджет – 250 000 000 евро

- ○ Предложение по поканата – подадено към ЕК на 8 май 2026 г. с бюджет 34 900 000 евро с включено национално съфинансиране

- ✓ Дейности – 6 работни пакета: Работен пакет 1: „2 бр. фиксирана радарна система“; 2. Работен пакет 2: „2 бр. фиксирана антидрон система“; 3. Работен пакет 3 „3 бр. мобилна антидрон система“; 4. Работен пакет 4 „10 бр. автономни дрон станции за автоматизирано въздушно наблюдение“; 5. Работен пакет 5 „10 бр. преносими антидрон комплекти за бързо реагиране“; 6. Работен пакет 6 „Модернизиране на 1 Регионален координационен център и 2 Локални координационни центъра“.
- ✓ Частично одобрено от ЕК на 13 октомври 2026 г. в размер на 24 430 000 евро с включено национално съфинансиране

- ✓ Бенефициент – Главна дирекция „Гранична полиция“-МВР

Съфинансирано от Европейския съюз



ПРЕДСТОЯЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА-3

- **Финансов ресурс по програмата по ИУГВП 2021-2027 г.**

- Общ бюджет с национално съфинансиране – **447 134 556 евро**
  - Финансиране от ЕС – **371 588 182 евро**
  - Техническа помощ – **21 109 568 евро**
- Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“ – **406 639 539 евро**
- Специфична цел 2 „Обща визова политика“ – **19 385 449 евро**

Съфинансирано от Европейския съюз



ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2026 г. ПО ИУГВП 2021-2027 г.

Съфинансирано от Европейския съюз



ИЗМЕНЕНА ИГРП ЗА 2026 г. ПО ИУГВП-1

✓ **Изменението на ИГРП е извършено през м. май 2026 г.**

✓ **Добавени са 5 нови операции в рамките на процедура № 2 от програмата:**

- Операция „Доставка на МПС и инженерна техника“ с индикативен бюджет 3 562 729 евро. Бенефициент – Главна дирекция „Гранична полиция“-МВР
- Операция „Доставка на безпилотни летателни системи“ с индикативен бюджет 480 000 евро. Бенефициент – Главна дирекция „Гранична полиция“-МВР
- Операция „Развитие на административния капацитет на служителите, работещи с ЕТИАС“ с индикативен бюджет 180 000 евро. Бенефициент – Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“-МВР
- Операция „Надграждане с нови функционалности и модифициране на софтуера на националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (CAFIS) и ЕВРОДАК“ с индикативен бюджет 1 741 191 евро. Бенефициент – Национален институт по криминалистика
- Операция „Следгаранционна поддръжка на видеонаблюдението на ГКПП“ с индикативен бюджет 3 262 092 евро. Бенефициент – Дирекция „Комуникационни и информационни системи“-МВР

✓ **Операциите са в процес на оценка**

Съфинансирано от Европейския съюз



НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА 2021-2027 г.

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ 2026 Г. ОТ ИГРП ЗА 2025 Г. И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ (1/3)



- ✓ Проведена е 1 процедура от ИГРП 2025 г. през предходен отчетен период:

- ❑ Процедура на директно предоставяне на БФП (BG65BVPR001-1.010) Процедура № 2, Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“ от ИГРП за 2025 г. (Изграждане и обособяване на центрове за скрининг, обучения, доставка на МПС, възстановяване на средства за заплати, оборудване)
- ❑ Бенефициенти по процедурата – Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, дирекция „Миграция“ – МВР и Национален институт по криминалистика- МВР

- ❑ Обща стойност на процедурата – 54 560 983 евро
- ❑ Издадени са 4 заповеди за предоставяне на БФП на обща стойност 32 478 313,03 евро с бенефициенти ГДГП, ДМ, НИК (Изграждане на 2 центъра за скрининг, възстановяване на средства за заплати, обучения, доставка на МПС, оборудване)

- ❑ Предстои подаване на проектни предложения по операции 2, 3 и 4 със срок 30.10.2026 г. от ДМ-МВР (обособяване на центрове за скрининг) на обща стойност 21 750 000 евро

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ 2026 Г. ОТ ИГРП ЗА 2026 Г. И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ (2/3)



- ✓ Проведени са 2 процедури през отчетния период от ИГРП за 2026:
- ❑ Процедура № 1 на директно предоставяне на БФП (BG65BVPR001-1.011) по Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“ от ИГРП за 2026 г. (доизграждане на НШИС, доставка на оборудване и софтуер, следгаранционна поддръжка на TETPA, разширяване обхвата на ИСН по българо-турската граница)
- ❑ Бенефициенти по процедурата – Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР
- ❑ Обща стойност на процедурата – 27 880 365 евро
- ❑ Издадени са 7 заповеди за предоставяне на БФП на обща стойност 27 285 926,58 евро.
- ❑ Спестен ресурс – 594 438,42 евро

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ 2026 Г. ОТ ИГРП ЗА 2026 Г. И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ (3/3)

- Процедура № 2 на директно предоставяне на БФП (BG65BVPR001-1.012), Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“ и специфична цел 2 „Обща визова политика“ (Осъвременяване на хардуерни и софтуерни ресурси, обслужващи НВИС, доставка на МПС и инженерна техника, доставка на безпилотни летателни системи, развитие на административния капацитет на служители на ЕТИАС, надграждане на софтуера на ЕВРОДАК, следгаранционна поддръжка на видеонаблюдението на ГКПП)

- Бенефициенти по процедурата – МВнР, Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, Национален институт по криминалистика, дирекция „Комуникационни и информационни системи“

- Обща стойност на процедурата – 13 519 462,05 евро

- 5 операции се оценяват към настоящия момент. Предстои подаване на проектно предложение по операция 1 на МВнР със срок 30.10.2026 г.

Съфинансирано от Европейския съюз



НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА 2021-2027 г.

Съфинансирано от Европейския съюз

Напредък в изпълнението на програмата по ИУГВП



Одобрени за финансиране **64** проекта, от които **1** приключил и **2** прекратени

До момента по програмата са одобрени:

- **68** анекса/заповеди за БФП и 82 малки промени;

- **52** искания за авансови плащания;

- **365** искания за междинни плащания, от получени **405**.

Съфинансирано от Европейския съюз

Финансово изпълнение на програмата по ИУГВП

Бюджет на програмата – **420 832 925 евро**

Получени средства от ЕК за периода 2022 – 2026 г. – **128 297 000 евро,**

в т. ч. за 2026 г. – **46 253 000 евро**

В изпълнение – **64** заповеди/договори за БФП – **373 575 500 евро**

Разплатени – **141 007 600 евро**

в т. ч. за 2026 г. – **48 265 900 евро**



Съфинансирано от Европейския съюз

Финансово изпълнение на програмата по ИУГВП

Прогноза за плащанията, изпратена към ЕК през 2026 г.

01 – 10.2026 г. - 46 909 000 €

11 – 12.2026 г. - 20 589 000 €


01 – 12.2027 г. - 44 046 000 €



Съфинансирано от Европейския съюз

Финансово изпълнение спрямо другите програми при споделено управление 2021-2027

	Програма	Договорени средства %	Реално изплатени суми %
1	ПРЧР 2021-2027	73.92	43.55
2	ПО 2021-2027	82.72	33.96
3	ПХ 2021-2027	89.86	72.50
4	ПОС 2021-2027	88.21	19.62
5	ПТП 2021-2027	81.28	31.05
6	ПКИП 2021-2027	79.96	28.78
7	ПТС 2021-2027	83.88	35.18
8	ПРБФУМИ	66.41	23.72
9	ПРБИУГВП	84.71	33.51
10	ПРБФВС	78.25	25.23
11	ПНИИДИТ	45.45	12.83
12	ПРР 2021-2027	82.44	22.79
13	ПМДРА 2021-2027	49.69	15.83
14	СПРЗСР-ВОМР	24.21	2.20

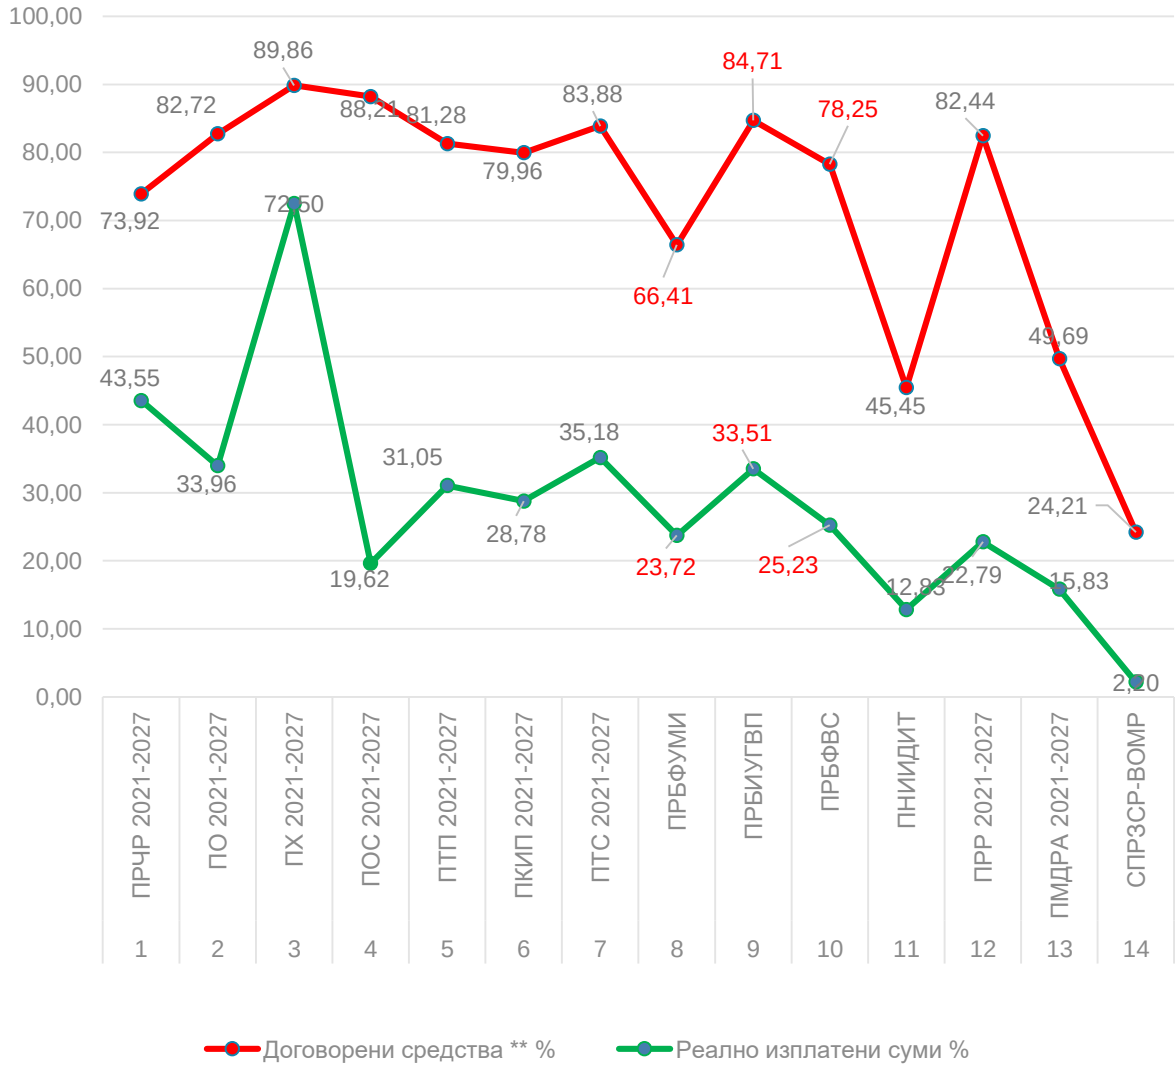

Съфинансирано от Европейския съюз



Контрол на документации и обществените поръчки

1. Предварителен контрол на технически спецификации и документации по ИУГВП – **21 бр.** за периода от ноември 2025 до момента
2. Последващ контрол – **42 бр.** обществени поръчки за периода от ноември 2025 до момента

Съфинансирано от Европейския съюз

СИГНАЛИ И НЕРЕДНОСТИ ПО ИУГВП 2021-2027

Сигнали за нередности (ИУГВП)

Регистрирани 18 сигнала за нередности

- 14 от последващ контрол на УО
- 4 от външни източници

Установени нередности (11):

- Ограничителни изисквания
- Незаконосъобразен избор на изпълнител
- Несъответствие на техническо предложение
- Незаконосъобразно изменение на договор



Съфинансирано от Европейския съюз

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ПО ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА 2021-2027 г.



Съфинансирано от Европейския съюз

Напредък в изпълнението на програмата по ИУГВП, СЦ 1 стр. 1

Общи показатели за краен продукт				
Специфична цел	Идентификатор	Наименование на показателя	Целева стойност 2029 г.	Верифицирани към 26.10.2026 г.
1	**O.1.1**	Брой единици оборудване, закупени за граничните контролно-пропускателни пунктове	80 2290	**1471**
1	**O.1.10***	Брой разработени/поддържани/модернизирани функционални възможности, базирани на ИТ	4	**10**

Стойността по **O.1.10:*

1. Поддръжка на националните компоненти на широкомащабни ИС ,

2. Развитие на Система вход/изход по сухопътни, речни и морски ГКПП по външни граници на ЕС ,

3. Надеждна и непрекъсната работа на национални компоненти на АИС, обменящи данни с ИС на ЕС.

Съфинансирано от Европейския съюз

Напредък в изпълнението на програмата по ИУГВП, СЦ 1 стр. 2

Общи показатели за краен продукт				
Специфична цел	Идентификатор	Наименование на показателя	Целева стойност 2029 г.	Верифицирани към 26.10.2026 г.
1	**О.1.11**	Брой разработени/поддържани/модернизирани широкомащабни информационни системи на ЕС	1	**3**
1	**О.1.7**	Брой закупени сухопътни транспортни средства	619	**469**

Стойността по О.1.11:

1. Развитие на Система вход/изход по сухопътни, речни и морски ГКПП по външни граници на ЕС

2. Следгаранционна поддръжка на софтуер и технически средства за целите на Н.ШИС

3. Развитие на Система вход/изход по сухопътни, речни и морски ГКПП по външни граници на ЕС, по 0.1.7, преди е било 427

Съфинансирано от Европейския съюз

Напредък в изпълнението на програмата по ИУГВП, СЦ 1 стр. 3

Общи показатели за краен продукт				
Специфична цел	Идентификатор	Наименование на показателя	Целева стойност 2029 г.	Верифицирани към 26.10.2026 г.
1	**R.1.14**	Брой на единиците оборудване, регистрирани във фонда от техническо оборудване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана	768	**3**
1	**O.1.5**	Брой закупени въздухоплавателни средства	3	**3**
1	**O.1.5.1**	Брой закупени въздухоплавателни средства, от които брой закупени безпилотни въздухоплавателни средства	3	**3**

*Стойността по R.1.14 и **O.1.5** е по проект „Оборудване за националните компоненти на Европейската гранична и брегова охрана по ИУГВП*

Съфинансирано от Европейския съюз

Напредък в изпълнението на програмата по ИУГВП, СЦ 2

Общи показатели за краен продукт				
Специфична цел	Идентификатор	Наименование на показателя	Целева стойност 2029 г.	Верифицирани към 26.10.2026 г.
2	**О.1.4**	Брой разработени/поддържани/модернизирани функционални възможности, базирани на ИТ	185	**203**
2	**О.2.4**	Брой изградени/модернизирани съоръжения, предназначени за граничните контролно-пропускателни пунктове	1 1	**2**

Стойността по О.2.4 е по проекти: 1. „Надграждане на свързаността между МВнР и задграничните представителства на България“ и 2„Следгаранционна поддръжка и обновяване на софтуерните компоненти на НВИС“

Съфинансирано от Европейския съюз

Текущи покани и напредък в изпълнението на специфичните действия по Тематичния механизъм



Съфинансирано от Европейския съюз



ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПОКАНИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА 2026

✓ Текущи покани за Специфични действия

- ❑ „Подкрепа за националните рамки за управление на Шенгенското пространство“ с индикативен бюджет в размер на 4 000 000 евро. Поканата е предвидена за второто тримесечие на 2026 г.

- ❑ Проектно предложение подадено към ЕК на 24 септември 2026 г. на стойност 500 974 евро с включено национално съфинансиране:
- ❑ Дейности – Разширяване на националния механизъм за самооценка по Шенген; провеждане на национални мисии за оценка по Шенген; модернизация на централизираната цифрова система за обучение и мониторинг; семинари, уъркшопи и практическо обучение; последващи действия, координация и коригиращи мерки

✓ Предстоящи за публикуване покани за Специфични действия

- ❑ „Иновативни и автоматизирани решения и оборудване за улесняване на (предварителната) регистрация в Системата за влизане/излизане (EES) на сухопътни и морски граници. Поканата е предвидена за четвъртото тримесечие на 2026 г. Индикативен бюджет – 37 000 000 евро.

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Подготовка на потребителите и бюрото SIRENE за преходния период на оперативна съвместимост“

(BMVI/2021/SA/1.5.4)

- Общ бюджет на проектното предложение: **1 070 456,03 евро** - заповед от 22.01.2025 г.
- Бенефициент: дирекция „Международно оперативно сътрудничество“

Дейност	График към ЕК	График заповед за БФП	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Разработване и внедряване на софтуерно и хардуерно решение за системата i-STREAM	Н/П	30 месеца 22.07.2027 г.	Подготвена документацията за повторно обявяване на ОП след прекратяване на първата процедура. Предстои съгласуване и утвърждаване на решението за откриване. Планирана дата за обявяване: 30.10.2026 г.	Н/П	Предприети са действия за изменение на ЗБФП.

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Подготовка на потребителите и бюрото SIRENE за преходния период на оперативна съвместимост“

(BMVI/2021/SA/1.5.4)



Дейност	График към ЕК	График заповед за БФП	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Въвеждане на допълнителна мярка за сигурност в помещенията на бюро СИРЕНЕ	Н/П	Н/П	Приключено е изпълнението на Договор № 5785мпд-9/23.01.2026 г., сключен с „Хидрострой – БГ 63“ ЕООД. Регистриран е сигнал за нередност от последващ контрол от УО. Към настоящия момент тече срока за разглеждане на възраженията на бенефициента.	Н/П	Н/П

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Подготовка на потребителите и бюрото SIRENE за преходния период на оперативна съвместимост“

(BMVI/2021/SA/1.5.4)





Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Подкрепа за държавите членки за укрепване на капацитета за граничен контрол в светлината на специалния Европейски съвет от февруари 2023 г.“ (BMVI/2023/SA/1.1.2/002)

- Общ бюджет: **47 169 276,49 €**
- Бенефициент: ГДГП-МВР
- **Дейност**: Подкрепа за държавите членки за повишаване на контрола съгласно Европейски съвет от 2023 г., продължителност 48 месеца

Дейност	График към ЕК	График по заповед за БФП	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Доставка на патрулни автомобили за наблюдение на държавната граница	3 месеца – процедура ЗОП 18 месеца - изпълнение	21 месеца	Изпълнена Доставени **70** МПС с повишена проходимост	Преодоляно	Изпълнен договор за доставка на МПС
Разширяване обхвата на ИСН по българо-турската граница - етап 4 от ГКПП Лесово до р. Резовска	**3 месеца** – процедура ЗОП 15 месеца – изпълнение	48 месеца	В изпълнение **Етап 1** – заложени 13 СЛ. Изградени 12 СЛ, покрит участък с дължина 55 км	Няма	*N/A* - ***Етап 2** се финансира по СД BMVI/2023/SA/1.1.4/06 (е-наблюдение)*

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Подкрепа за държавите членки за укрепване на капацитета за граничен контрол в светлината на специалния Европейски съвет от февруари 2023 г.“ (BMVI/2023/SA/1.1.2/002)

Дейност	График към ЕК	График по заповед за БФП	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Назначаване на допълнителен срочно нает персонал	12 месеца	13 месеца	Изпълнена	Няма	N/A
Осигуряване на средства за командироване на персонал	3 месеца - процедура ЗОП 15 месеца - изпълнение	През първия етап дейността бе финансово обезпечена за периода 01.04.2024 г.- 31.03.2025 г. Вторият етап стартира от 01.06.2026 г. - 31.12.2026 г. или до изчерпване на допълнителния финансов ресурс от 2 300 370 евро	В изпълнение	Няма	N/A



Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Подкрепа за държавите членки за укрепване на капацитета за граничен контрол в светлината на специалния Европейски съвет от февруари 2023 г.“ (BMVI/2023/SA/1.1.2/002)

Сензорна линия 32 и агрегираща точка





Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Подкрепа за държавите членки за укрепване на капацитета за граничен контрол в светлината на специалния Европейски съвет от февруари 2023 г.“ (BMVI/2023/SA/1.1.2/002)

Локален координационен център - Болярово





Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Подкрепа за държавите членки за укрепване на капацитета за граничен контрол в светлината на специалния Европейски съвет от февруари 2023 г.“ (BMVI/2023/SA/1.1.2/002)

Доставени 70 бр. автомобили с висока проходимост







Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Система за електронно наблюдение на външните граници (е-наблюдение)“ (BMVI/2023/SA/1.1.4/06)

- **Общ бюджет**: **28 999 555,18 €**
- **Бенефициент**: Главна дирекция „Гранична полиция“-МВР
- **Дейност**: Разширяване обхвата на ИСН по българо-турската граница чрез изграждане на Интегрирана система за наблюдение по българо-турската граница - етап 4 от ГКПП Лесово до р. Резовска, заповед от 15.10.2024 г.



Дейност	График към ЕК	График по заповед	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Изграждане на 9 сензорни линии с обща дължина 40 км	36 месеца	48 месеца (15.10.2028 г.)	Сключен договор рег. № 3282оп-1702 от 26.11.2024 г., изпълнява се Изградени **7** сензорни линии.	Не са констатирани	N/A
Разширяване на регионален координационен център					
Разширяване на локален координационен център 2 бр.					

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Система за електронно наблюдение на външните граници (е-наблюдение)“ (BMVI/2023/SA/1.1.4/06)


- **Дейност**: Разширяване обхвата на ИСН по българо-турската граница чрез изграждане на Интегрирана система за наблюдение по българо-турската граница - етап 4 от ГКПП Лесово до р. Резовска

Дейност	График към ЕК	График по заповед	Статус към м. октомври 2026 .	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Изграждане на СПНСЛ – 3 бр.	36 месеца	48 месеца (15.10.2028 г.)	Изпълнено разширение на ЛКЦ Резово, ЛКЦ Малко Търново Извършени СМР в ЛКЦ и РКЦ и доставки на оборудване и софтуер Проведени обучения на състава	Не са констатирани	N/A
Изграждане на кабелни трасета, резервно захранване, комуникационна и оптична свързаност					
Инсталиране на софтуерни приложения					

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Система за електронно наблюдение на външните граници (е-наблюдение)“
(BMVI/2023/SA/1.1.4/06)

Пост за наблюдение на сензорна линия 25

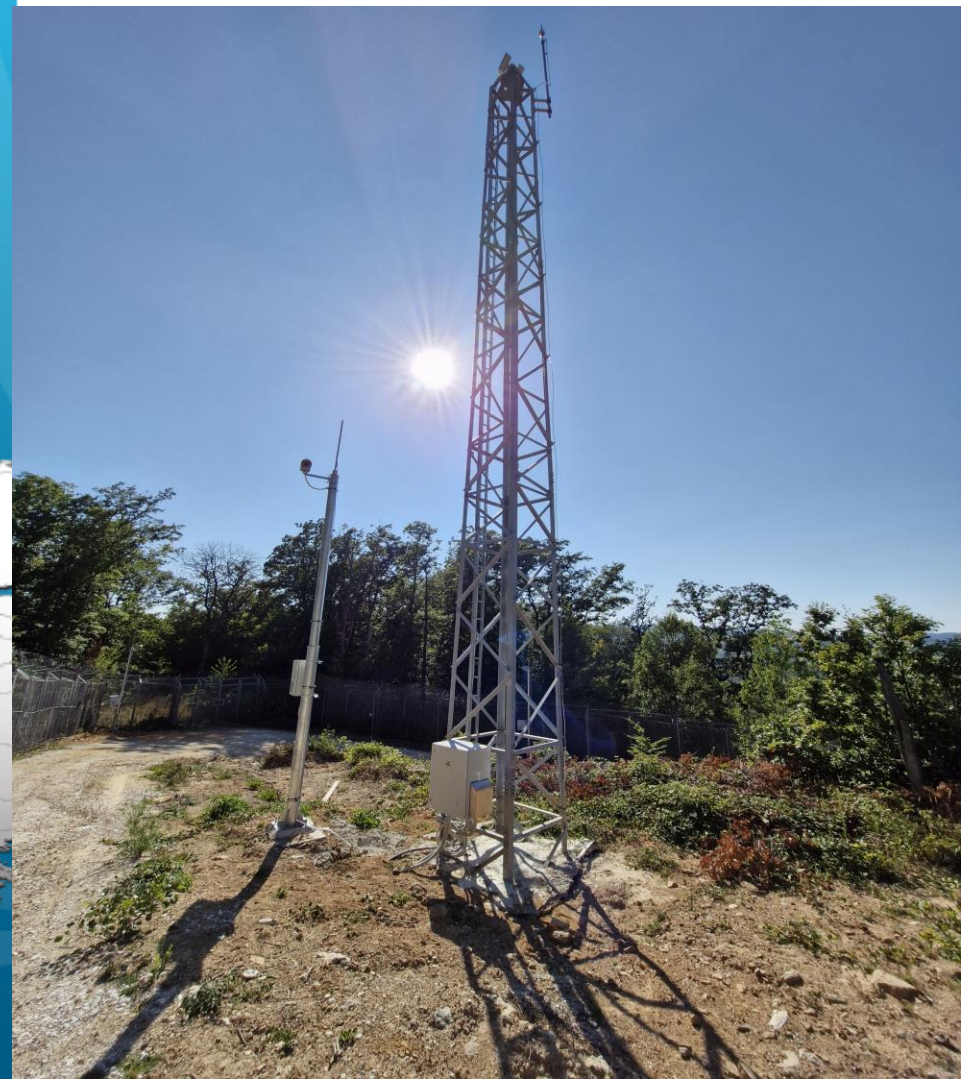



Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Система за електронно наблюдение на външните граници (е-наблюдение)“
(BMVI/2023/SA/1.1.4/06)

Сензорна линия 38 и агрегираща точка









Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Повишаване на националните способности на външните граници на ЕС)“ (BMVI/2024/SA/1.1.6/04)

- Общ бюджет: **28 816 557,16 €**
- Бенефициент: Главна дирекция „Гранична полиция“-МВР, заповед № 426 от 12.06.2025 г.

Дейност	График към ЕК	График заповед	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Изграждане и осъвременяване с нови технически средства на Интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово – ИСН 1.	24 месеца	24 месеца	Изготвена е документация за провеждане на обществена поръчка. Предстои обявяване на ОП.	Забавено обявяване на ОП	Мониторинг от УО

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Повишаване на националните способности на външните граници на ЕС)“ (BMVI/2024/SA/1.1.6/04)

- **Дейност** „Доставка на специализирани мобилни системи за наблюдение (СМСН) интегрирани в Интегрираната система за наблюдение по българо-турската граница“

Дейност	График към ЕК	График по заповед за БФП	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Доставка на 6 броя специализирани мобилни системи за наблюдение (СМСН) интегрирани в Интегрираната система за наблюдение по българо-турската граница		24 месеца	Рамково споразумение № 3282оп-1504/23.10.2024 г. Сключен договор 3282оп - 672 на 15.06.2026 г. за доставка на 6 броя специализирани мобилни системи за наблюдение, интегрирани в ИСН	Не са констатирани	Не е приложимо

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Интегрирани решения за автоматизиран граничен контрол”
(BMVI/2023/SA/1.1.3/004)

- **Общ бюджет**: **1 819 972,08 €**
- **Бенефициент:** ГДГП-МВР (дата на заповед за БФП 23.02.2024 г.)
- **Дейност**: „Интегрирани решения за улесняване и автоматизиране на преминаването на границите“

Дейност	График към ЕК	График по заповед за БФП	Статус към м. август 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Внедряване на системи за самообслужване, e-gates или ABC gates „Изграждане на система за автоматизиран граничен контрол за граждани на ЕС и граждани на трети страни на сухопътни граници на Р. България – ГКПП Калотина и ГКПП Капитан Андреево"	36 месеца	60 месеца* (крайна дата на заповед по БФП – 23.04.2029 г.)	Сключен договор за възлагане. Срок 210 календарни дни, считано от 28.07.2026 г.	Генерирано закъснение в периода на провеждане на предвидени процедури	Ускоряване на процеса на договаряне по ЗОП
Обособяване на зони за граничен контрол на ГКПП, разположени на речната граница на Р. България, изграждане на система за видеонаблюдение и охрана на кабини за гранични проверки на граждани на ЕС и на граждани на трети страни	36 месеца	24 месеца (крайна дата на заповед по БФП – 23.04.2026 г.)	Изпълнен договор за възлагане на 17.08.2026 г. Оборудването е в експлоатация.		


**Срок на дейността, договорен в заповедта за предоставяне на БФП*

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Интегрирани решения за автоматизиран граничен контрол”
(BMVI/2023/SA/1.1.3/004)

- **Общ бюджет**: **1 819 972,08 €**
- **Бенефициент:** ГДГП-МВР (дата на заповед за БФП 23.02.2024 г.)
- **Дейност**: „Интегрирани решения за улесняване и автоматизиране на преминаването на границите“



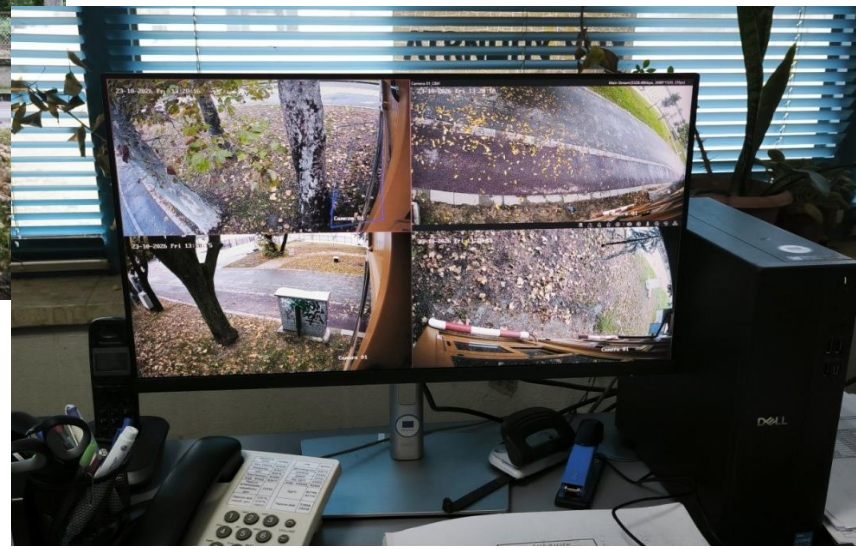

Съфинансирано от Европейския съюз

СД “Подкрепа за интегрирано гранично управление на държавите членки”

- Общ бюджет: **764 063,34 €**
- Бенефициент: ГДГП-МВР, заповед № 425 от 12.06.2025 г.

Дейност	График към ЕК	График заповед	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Подкрепа за националните стратегии за европейско интегрирано гранично управление на държавите членки	До 31.12.2029 г.	19 месеца	Приключено е тестването на плана за действие при извънредни ситуации по българо-турската граница, а мярка BG033 от Фронтекс е изпълнена. Продължава разработването на ИТ приложение за сектор „Фронтекс“, предстои обмен на добри практики.	Забавяне при процедурите за ОП	Бенефициентът ще предложи удължаване срока на СД



Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Оборудване за националните компоненти на Европейската гранична и брегова охрана по ИУГВП“ (BMVI/2023-2024/SA/1.2.2/07)

- **Общ бюджет: 23 624 986,84 €**
- **Бенефициент**: ГДГП-МВР, заповед от 23.02.2024 г.
- **Дейност**: Оборудване за националните компоненти на Европейската гранична и брегова охрана по ИУГВП”

Дейност	График към ЕК	График заповед	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Доставка и гаранционно обслужване на гранично-полицейски патрулен кораб	01.04.2024 г. до 01.11.2028 г.	57 месеца 23.02.2024 г. до 30.11.2028 г.	ОП публикувана в ЦАИС ЕОП на 13.07.2026 г. Една подадена оферта. Отваряне на ценово предложение на 13.10.2026 г.	Планирана дата на обявяване 01.07.2024 г. Прекратена предходна процедура	УО извършва интензивен мониторинг и ускорен предварителен контрол на процедурите за ОП. Ускоряване на процеса на договаряне по ЗОП
Доставка и гаранционно обслужване на леки автомобили с повишена проходимост	01.04.2024 г. до 01.11.2028 г.	57 месеца 23.02.2024 г. до 30.11.2028 г.	Подписан договор за възлагане със срок на изпълнение 4 месеца, считано от 14.07.2026 г.	Закъснение при провеждане на предвидени процедури	

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Оборудване за националните компоненти на Европейската гранична и брегова охрана по ИУГВП“ (BMVI/2023-2024/SA/1.2.2/07)



- **Дейност**: Оборудване за националните компоненти на Европейската гранична и брегова охрана по ИУГВП

Дейност	График към ЕК	График по заповед	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Доставка и гаранционно обслужване на леки автомобили с повишена проходимост за транспорт на служебни кучета	01.04.2024 г. до 01.11.2028 г.	57 месеца 23.02.2024 г. до 30.11.2028 г.	Подписан договор за възлагане със срок на изпълнение 4 месеца, считано от 14.07.2026 г.	Закъснение в процедурата	УО извършва ускорен предварителен контрол на процедурите за ОП. Ускоряване на процеса на договаряне по ЗОП
Доставка на привързана безпилотна летателна система	01.04.2024 г. до 01.11.2028 г.	57 месеца 23.02.2024 г. до 30.11.2028 г.	Оборудването е доставено и въведено в експлоатация	Няма	N/A

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Оборудване за националните компоненти на Европейската гранична и брегова охрана по ИУГВП“ (BMVI/2023-2024/SA/1.2.2/07)

привързана безпилотна летателна система



Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Електронни системи за наблюдение на външните морски граници“ (BMVI/2024/SA/1.1.7/04)

- Общ бюджет: **20 966 134,87 €**
- Бенефициент: ГДГП-МВР, заповед от 12.03.2025 г.
- **Дейност**: Надграждане на Интегрираната система за наблюдение „Синя граница”,



Дейност	График към ЕК	График по заповед	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Доставка на осем (8) радарни станции за голям обсег на СПТН или в близост до тях	30 месеца	34 месеца (12.01.2028 г.)	Подготовка на документация за обявяване на ОП. Планирана дата за обявяване на ОП – 15.10.2026 г.	Закъснение в процедурата по ЗОП над 1 година.	УО извършва ускорен предварителен контрол на процедурите за ОП.
Доставка на осем (8) модерни нови термовизионни нощни камери от СПТН	30 месеца	34 месеца (12.01.2028 г.)			

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Електронни системи за наблюдение на външните морски граници“ (BMVI/2024/SA/1.1.7/04)

Дейност	График към ЕК	График по заповед	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприет и действия
Модернизация на Черноморски граничен координационно-информационен център	30 месеца	34 месеца (12.01.2028 г.)	Подготовка на документация за обявяване на ОП. Планирана дата за обявяване на ОП – 15.10.2026 г.	Закъснение в процедурата по ЗОП над 1 година.	УО извършва ускорен предварителен контрол на процедурите за ОП.
Доставка на дванадесет (12) системи за обмен на данни Доставка на дванадесет (12) метеорологични станции Доставка на дванадесет (12) радиосистеми за гласова комуникации Доставка на работни станции и оборудване за съхранение на данни	30 месеца	34 месеца (12.01.2028 г.)			



Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Подкрепа за държавите членки за умни граници“ (BMVI/2024/SA/1.5.1)

- Общ бюджет на: **1 710 942,47 евро - заповед от 03.01.2025 г.**
- Бенефициент – Дирекция „Комуникационни и информационни системи“, партньор – Главна дирекция „Гранична полиция“-МВР
- **Дейност:** „Доставка на материали и оборудване, използвани за работата на Системата вход/изход, включително хардуер, използван от Системата вход/изход на гранично-пропускателните пунктове”

Дейност	График към ЕК	График по заповед	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Доставка на сървърна платформа за Системата вход/изход по сухопътни, речни и морски ГКПП по външните граници на ЕС	Юни 2026	03.03.2026 г.	Сключен и изпълнен договор 5290оп-522 / 01.12.2025 г.	Н/П	Н/П

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Подкрепа за държавите членки за умни граници“ (BMVI/2024/SA/1.5.1)

Дейност	График към ЕК	График по заповед	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Изграждане на автобусни терминали на трасе „вход“ и трасе „изход“ на ГКПП Гюешево	31.12.2027 г. удължене проекта с одобрение от ЕК	Декември 2027 г.	Изготвено е предложение за издаване на виза за проектиране. Очаква се обявяване на поръчката за инвестиционен проект, СМР и авторски надзор до края на октомври 2026 г., а за оценка на съответствието, строителен надзор и инвеститорски контрол – на 01.11.2026 г.	Закъснение от 11 дни за обявяване на ОП за Изграждане на двата автобусни терминала на трасе „Вход“ и трасе „Изход“ на ГКПП Гюешево	Удължен е срокът до 31.12.2027 г, след получено одобрение от Генерална дирекция «Миграция и вътрешни работи» към ЕК

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Подкрепа за държавите членки за умни граници“ (BMVI/2024/SA/1.5.1)



Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Подкрепа за държавите членки за умни граници“ (BMVI/2024/SA/1.5.1)

Дейност	График към ЕК	График по заповед	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Инсталиране на нова система за автоматизиран граничен контрол - електронни гишета (ABC gates) с две пътеки за автобусен терминала на „вход“, цялостна ИТ инфраструктура, 2 броя устройства за заснемане на лице с автоматично разпознаване на височината на тялото на пътника и 2 броя устройства за снемане на пръстови отпечатъци на АРМ за граничен контрол	31.12.2027 г. удължен е проекта с одобрение от ЕК	Декември 2027 г.	Дейността ще се изпълни **след изграждане** на автобусните терминали. одготовка на документацията за ОП. Планирана дата за ОП - 30.03.2027 г.	Н/П	Удължен е срока на заповедта за БФП до 31.12.2027 г, след като е получено одобрение от ГД „Миграция и вътрешни работи“ към ЕК

Съфинансирано от Европейския съюз



Напредък по проекти по Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището

Съфинансирано от Европейския съюз

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПАКТА НА ЕС ЗА МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ



✓ Специфично действие за изпълнение на Пакта за миграция и убежище (54 560 983 евро за изпълнение на дейности)

❑ Главна дирекция „Гранична полиция“ – общо разпределени 22 574 122 евро

- издадени заповеди за БФП – 22 574 122 евро (100% от средствата за ГДГП)

❑ Дирекция „Миграция“ – общо разпределени 25 250 000 евро

- обявена процедура от ИГРП за 2025 г. – 21 750 000 евро
- издадена заповед за БФП – прибл. 3 200 000 евро (12,6% от средствата за ДМ)

❑ Национален институт по криминалистика – общо разпределени 6 736 861 евро

- издадена заповед за БФП – 6 736 861 евро (100% от средствата за НИК)

❑ приблизително 60 % от средствата по Пакта са договорени

Съфинансирано от Европейския съюз

Адаптиране на АДИС ЕВРОДАК към изискванията на Регламент 2024/1358 и обновяване на CAFIS

- Общ бюджет на проектното предложение: **6 736 861,46 евро** - заповед от 03.04.2026 г.
- Бенефициент: дирекция „Национален институт по криминалистика “(НИК)

Дейност	График заповед за БФП	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Дейност 1: Адаптиране на националната АДИС ЕВРОДАК към изискванията на новия Регламент (ЕС) 2024/1358	45 месеца 31.12.2029 г.	1. Обществена поръчка „Обновяване и модифициране на софтуера на националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система CAFIS и ЕВРОДАК … за изпълнение на прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1358“ **Сключен договор № 5785мпд-83/24.09.2025 г. с "Булснайт" ЕООД** 2. Обществена поръчка "Доставка на специализирани биометрични станции ЕВРОДАК и обновяване на съществуващи биометрични станции за нуждите на ГДГП - МВР и ДМ - МВР“ **Избран е изпълнител. Очаква се оправомощаване на нов Възложител за подписване на договор.**	Н/П	Н/П

Съфинансирано от Европейския съюз

Адаптиране на АДИС ЕВРОДАК към изискванията на Регламент 2024/1358 и обновяване на CAFIS

Дейност	График заповед за БФП	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Дейност 2: Обновяване и модифициране на националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система CAFIS и ЕВРОДАК - CAFIS v5.5 до актуална версия - CABIS v7 или по нова /Baseline инсталация/ за изпълнение на прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1358	45 месеца 31.12.2029 г.	1.Обществена поръчка "Надграждане с нови функционалности, миграция на работни процеси и данни, допълване и модифициране на софтуера на националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (CAFIS) и ЕВРОДАК до последна версия на CABIS" **Подготовка на проект на документация.** 2. Обществена поръчка "Доставка и гаранционна поддръжка на АФИС мобилни станции – за нуждите на ДМ, звената Миграция в СДВР и ОДМВР“ **Проектът на документацията е преминал електронно съгласуване.**	Н/П	Н/П

Съфинансирано от Европейския съюз

Проект,
изпълняван от дирекция „ Миграция“ – МВР във връзка с Плана за изпълнение в Република България на Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището

Проект BG65BVPR001-1.010-0003-C01 „ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СКРИНИГ ЦЕНТРОВЕТЕ НА ДМ-МВР“

Специфично действие по ИУГВП за изпълнение на Пакта за убежище и миграция.

Цел: Осигуряване на надежден автопарк за скрининг центровете в София, Любимец и Елхово и обезпечаване на оперативните дейности

Предвидени за закупуване: **46** превозни средства



20
Леки автомобила
4+1 места



18
буса
8+1 места



4
буса
16+1 места



4
линейки
8+1 места

3 167 330,03 евро
бюджет

27.04.2026 г. – 27.04.2028 г.
Период на изпълнение



Съфинансирано от Европейския съюз

Проект BG65BVPR001-1.010-0003-C01 „ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СКРИНИГ ЦЕНТРОВЕТЕ НА ДМ-МВР“

Специфично действие по ИУГВП за изпълнение на Пакта за убежище и миграция.

ОП с предмет „Доставка чрез закупуване и гаранционно обслужване на нови превозни средства за нуждите на дирекция „Миграция“ по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка и гаранционно обслужване на 20 броя леки автомобили (4+1 места)“

Обособена позиция № 2: „Доставка и гаранционно обслужване на 18 броя бусове (8+1 места)“

Обособена позиция № 3: „Доставка и гаранционно обслужване на 4 броя бусове (16+1 места)“

Обособена позиция № 4: „Доставка и гаранционно обслужване на 4 броя специализирани автомобили за оказване на спешна медицинска помощ (линейки)“

2 454 398,76 ЕВРО БЕЗ ДДС
Прогнозна стойност

Отразяване на коментари от предварителен контрол
Задължителен контрол от АОП (чл. 229 и чл. 232 от ЗОП)
Текущ етап на изпълнение

Съфинансирано от Европейския съюз

Съфинансирано от Европейския съюз

Проекти, изпълнявани от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР по Програмата на Република България по ИУГВП за периода 2021 – 2027 г. във връзка с Плана за изпълнение в Република България на Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МВР
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

Проекти изпълнявани от ГДГП – МВР по Програмата на Република България по ИУГВП за периода 2021 – 2027 г. във връзка с Плана за изпълнение в Република България на Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището

По Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021 – 2027 г. във връзка с Плана за изпълнение в Република България на Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището, Главна дирекция «Гранична полиция» – МВР изпълнява следните проекти:

1. **Проект BG65BVPR001-1.010-0002 „Укрепване на административния капацитет на ГДГП-МВР за извършване на скрининг“, финансиран със заповед за БФП № 8121нт-191 от 03.04.2026 г.**
   Стойност на проекта - 7 235 130 евро (седем милиона двеста тридесет и пет хиляди сто и тридесет евро).
   Срок за изпълнение 44 (четиридесет и четири) месеца до 03.12.2029 г.

По проекта са предвидени за изпълнение следните дейности:
- Персонал за скрининг центровете в Елхово и Драгоман;
- Обучение на персонал за скрининг центровете на ГДГП;
- Доставка на моторни превозни средства за нуждите на скрининг центровете.

2. **Проект BG65BVPR001-1.010-0004 „Изграждане на скрининг центрове на ГДГП в РДГП Елхово и РДГП Драгоман “, финансиран със заповед за БФП № 8121нт-256 от 28.04.2026 г.**
   Стойност на проекта - 15 338 991 евро (петнадесет милиона триста тридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и една хиляди евро).
   Срок за изпълнение 15 (петнадесет) месеца до 28.07.2027 г.

По проекта са предвидени за изпълнение следните дейности:
- Изграждане на скрининг центрове от затворен тип на ГДГП в РДГП Елхово и РДГП Драгоман;
- Обзавеждане и оборудване на центрове за скрининг.

Проект BG65BVPR001-1.010-0002 „Укрепване на административния капацитет на ГДГП-МВР за извършване на скрининг“, финансиран със заповед за БФП № 8121нт-191 от 03.04.2026 г. по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021 – 2027 г.

Към настоящия момент изпълнението на проекта е както следва:

- **по дейност «Персонал за скрининг центровете в Елхово и Драгоман».**

По дейността е предвидено осигуряване на персонал в състав: 81 служителя с полицейски правомощия и 7 ЛРТП, които ще са към щата на главна дирекция „Гранична полиция“ и ще се използват за нуждите на двата центъра за скрининг разположени в Елхово и Драгоман за срок от 30 месеца или до изчерпване на финансовите средства за дейността по проекта.

С ДЗ рег. № 3282р-7474/05.03.2026 г. до министъра на вътрешните работи е предложено промяна в щатната структура на ГДГП. Откриването на нови такива са както следва:

-55 бройки за сектор Скрининг център Елхово;

- 31 бройки за Скрининг център Драгоман

Съгласно проекта се предвижда същите да бъдат назначени към 01.06.2027 г.

Проект BG65BVPR001-1.010-0002 „Укрепване на административния капацитет на ГДГП-МВР за извършване на скрининг“, финансиран със заповед за БФП № 8121нт-191 от 03.04.2026 г. по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021 – 2027 г.

По дейност „Обучение на персонал за скрининг центровете на ГДГП“ се предвижда:

- Обучение от НИК-МВР на 5 служители от персонала за Скрининг центровете на ГДГП за работа със системата ЕВРОДАК. Продължителност на обучението – 1 ден;
- Обучение от АМВР-МВР на 21 служители от персонала за Скрининг центровете на ГДГП за скрининг. Продължителност – 5 дни.

Обученията са проведени както следва:

От 30.03.2026 г. до 03.04.2026 г. на курс за актуализация на професионалната квалификация „Провеждане на скрининг“ в АМВР са преминали 21 служителя на ГДГП.

На 28.04.2026 г. на курс за актуализация на професионалната квалификация „Обучение за работа с АФИС и ЕВРОДАК“ в НИК са преминали 5 служителя на ГДГП.

Проект BG65BVPR001-1.010-0002 „Укрепване на административния капацитет на ГДГП-МВР за извършване на скрининг“, финансиран със заповед за БФП № 8121нт-191 от 03.04.2026 г. по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021 – 2027 г.

По дейност «Доставка на моторни превозни средства за нуждите на скрининг центровете» се предвижда:

Доставка на 18 бр. сухопътни транспортни средства за нуждите на скрининг центровете на ГДГП в Елхово и Драгоман.

След проведена процедура по ЗОП са подписани три договора с отложено изпълнение по чл. 114 от ЗОП, при следния разчет:

- по договор № 3282оп-1585/27.11.2025 г. - 7 броя леки автомобили (4+1 места);
- по договор № 3282оп-1586/27.11.2025 г. - 7 броя микробуси (8+1 места);
- по договор № 3282оп-1585/27.11.2025 г. - 4 броя микробуси (16+1 места).

Обществената поръчка е завършена, договорите са изпълнени и моторните превозни средства за нуждите на скрининг центровете са доставени.

Автомобилите се използват за тази дейност, като след изграждане на центровете ще бъдат използвани единствено за нуждите на двата центъра, за транспортиране на граждани на трети страни, до скрининг центъра за извършване на скрининг, при необходимост до лечебни заведения, до центрове за настаняване свързани с различни процедури за убежище и/или връщане и др.

Проекти изпълнявани от ГДГП – МВР по Програмата на Република България по ИУГВП за периода 2021 – 2027 г. във връзка с Плана за изпълнение в Република България на Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището

Проект BG65BVPR001-1.010-0002 „Укрепване на административния капацитет на ГДГП-МВР за извършване на скрининг“, финансиран със заповед за БФП № 8121нт-191 от 03.04.2026 г. по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021 – 2027 г.

Изпълнение на дейност «Доставка на моторни превозни средства за нуждите на скрининг центровете»
Доставка на 7 бр. лек автомобил марка Ford Kuga, 4+1 места по договор № 3282оп-1586/27.11.2025 г.







Съфинансирано от Европейския съюз

Проекти изпълнявани от ГДГП – МВР по Програмата на Република България по ИУГВП за периода 2021 – 2027 г. във връзка с Плана за изпълнение в Република България на Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището

Проект BG65BVPR001-1.010-0002 „Укрепване на административния капацитет на ГДГП-МВР за извършване на скрининг“, финансиран със заповед за БФП № 8121нт-191 от 03.04.2026 г. по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021 – 2027 г.

Изпълнение на дейност «Доставка на моторни превозни средства за нуждите на скрининг центровете»
Доставка на 7 бр. микробуси Рено Трафик, 8+1 места по договор № 3282оп-1585/27.11.2025 г.







Проекти изпълнявани от ГДГП – МВР по Програмата на Република България по ИУГВП за периода 2021 – 2027 г. във връзка с Плана за изпълнение в Република България на Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището

Проект BG65BVPR001-1.010-0002 „Укрепване на административния капацитет на ГДГП-МВР за извършване на скрининг“, финансиран със заповед за БФП № 8121нт-191 от 03.04.2026 г. по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021 – 2027 г.

Изпълнение на дейност «Доставка на моторни превозни средства за нуждите на скрининг центровете»
Доставка на 4 бр. микробуси Ford Transit, 16+1 места по договор № 3282оп-1585/27.11.2025 г.







Съфинансирано от Европейския съюз

Проект BG65BVPR001-1.010-0002 „Укрепване на административния капацитет на ГДГП-МВР за извършване на скрининг“, финансиран със заповед за БФП № 8121нт-191 от 03.04.2026 г. по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021 – 2027 г.

Официална церемония по представяне на моторните превозни средства предназначени за нуждите на скрининг центровете.





Проект BG65BVPR001-1.010-0004 „Изграждане на скрининг центрове на ГДГП в РДГП Елхово и РДГП Драгоман “, финансиран със заповед за БФП № 8121нт-256 от 28.04.2026 г. по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021 – 2027 г.
Стойност на проекта - 15 338 991 евро (петнадесет милиона триста тридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и една хиляди евро).
Срок за изпълнение 15 (петнадесет) месеца до 28.07.2027 г.

По проекта са предвидени за изпълнение следните дейности:
1. «Изграждане на скрининг центрове от затворен тип на ГДГП в РДГП Елхово и РДГП Драгоман».
2. «Обзавеждане и оборудване на центрове за скрининг».

Към настоящия момент изпълнението на проекта е както следва:

1. По обществена поръчка с предмет: „Изграждане на помещения за извършване на скрининг в Главна дирекция „Гранична полиция” с две обособени позиции:

Обособена позиция №1 – „Изготвяне на инвестиционен проект (проектиране), изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: „Сграда за извършване на скрининг в РДГП Елхово”;

Обособена позиция №2 – „Изготвяне на инвестиционен проект (проектиране), изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: „Сграда за извършване на скрининг в РДГП Драгоман”.

Статус: В момента работи оценителна комисия за избор на изпълнител. Индикативна дата за сключване на договор - януари 2027 г.

Проект BG65BVPR001-1.010-0004 „Изграждане на скрининг центрове на ГДГП в РДГП Елхово и РДГП Драгоман “, финансиран със заповед за БФП № 8121нт-256 от 28.04.2026 г. по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021 – 2027 г.

Към настоящия момент изпълнението на проекта е както следва:

2. Обществена поръчка с предмет: „Извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве на сгради, предоставени за управление на Главна дирекция „Гранична полиция“ с обособени позиции:

Обособена позиция №1 - „Извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: „Сграда за извършване на скрининг в РДГП Елхово”

Обособена позиция №2 - „Извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: „Сграда за извършване на скрининг в РДГП Драгоман”

Статус: Планирана дата за обявяване на ОП - януари 2027 г.

Индикативна дата за сключване на договор - април 2027 г.

Проект BG65BVPR001-1.010-0004 „Изграждане на скрининг центрове на ГДГП в РДГП Елхово и РДГП Драгоман “, финансиран със заповед за БФП № 8121нт-256 от 28.04.2026 г. по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021 – 2027 г.

Към настоящия момент изпълнението на проекта е както следва:

3. Обществена поръчка с предмет: Доставка на офис обзавеждане и оборудване за сгради за извършване на скрининг в ГДГП.

Обществената поръчка ще бъде обявена след одобряване на инвестиционния проект, тъй като офис обзавеждане и оборудването на сградите са предмет на проектирането.

Индикативна дата – април 2027 г.

4. Обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърна, периферна и комуникационна техника за сгради за извършване на скрининг в ГДГП

Обществената поръчка ще бъде обявена след одобряване на инвестиционния проект, тъй като компютърната, периферна и комуникационна техника за сградите са предмет на проектирането.

Индикативна дата – април 2027 г.

Благодарим за вниманието!

Дирекция „Международни проекти“ – МВР

гр. София, ул. „Шести септември“ № 29
https://www.mvr.bg/dmp
e-mail: dmp@mvr.bg
тел.: +359 2 982 74 12
